



Recaudación Regional de Rentas de Torreón

GOBIERNO DEL ESTADO COAHUILA

Relación de correspondencia enviada por valija
a la Secretaría de Finanzas del Estado

PROCEDENCIA DATOS DE IDENTIFICACIÓN

DEPARTAMENTO: DIRECCION GENERAL DE PLANEACION

RESPONSABLE DEL ENVIO: ING. JAVIER G. GOMEZ ACUÑA FECHA: DIA 12 MES 07 AÑO 2013

DESTINO Y CARACTERISTICAS DE LA CORRESPONDENCIA

No. DE FOLIO	No. DE OFICIO	FECHA OFICIO	CLAVE	CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION	ÁREA A LA QUE SE REMITE EN S.F.E.
	8.1 PLAN/DG/143/13	09/07/2013		1 SOBRE CERRADO SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL FISM 2013	ING. ALEJANDRO GARCIA HERRERA COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO SECRETARIA DE FINANZAS CASTELAR Y GENERAL CEPEDA S/N ZONA CENTRO C.P 25000 SALTILLO COAHUILA

PARA USO EXCLUSIVO DE LA S.F.E.
(ACUSE DE RECIBO)

REC. REG. DE RENTAS DEL ESTADO
CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO

LINEA TRANSPORTISTA:

No. GUIA _____

FECHA: DIA 15 MES 07 AÑO 2013






Dirección General de Planeación
Torreón Coah., a 9 de Julio de 2013
8.1 PLA/DG/143/13
Asunto: FISM 2013

ING. ALEJANDRO GARCIA HERRERA
EL COORDINADOR GENERAL DE PROGRAMACION Y PRESUPUESTO
Presente.

Adjunto al presente encontrará informe del segundo trimestre de las obras aprobadas del Fondo de Infraestructura Social Municipal del Ejercicio Fiscal 2013 en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal, en su artículo 33 párrafo IV, en el que dice "Proporcionar a la Secretaría de Desarrollo Social, la información que sobre la utilización del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal le sea requerida. En el caso de los Municipios, lo harán por conducto de los Estados".

Sin otro particular por el momento, agradezco de antemano la atención que se sirva prestar al presente.

Atentamente

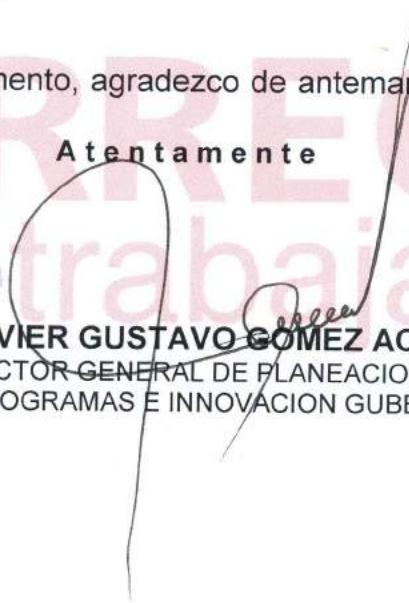

ING. JAVIER GUSTAVO GÓMEZ ACUÑA
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACION,
CONTROL DE PROGRAMAS E INNOVACION GUBERNAMENTAL

c.c.p. Ing. José Lauro Villarreal Navarro.- Director General de la Contraloría Municipal
c.c.p. Archivo 8.1
bme/ATH/JGGA





FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL



Torreón
gestionando

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON

CORTE DEL 01/04/2013 AL 30/06/2013 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

No.	No. de Asignación	No. de Obra	No. de Obra Municipal	DESCRIPCION DE LA OBRA	COLUMNA O LOCALIDAD	INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS)				METAS		BENEFICIARIOS	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	
						COSTO TOTAL	FISCAL (FISM)	MODIFICADO (CONTRATADO)		U. MEDIDA	CANTIDAD			FISICO	FINANCIERO
1	133500130	13350001	CO-001-13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROFRA. JOSEFINA RODARTE, AV. DE LOS AMORES Y CALLE QUE ENTRONCA CON AV. DE LOS AMORES ASI COMO CALLEJON.	EJIDO LA ROSITA	\$ 93,351.01	\$ 93,351.01	\$ 88,575.47		ML	334	22 HOGARES	EN PROCESO	5.00%	30.00%
2	133500131	13350002	CO-002-13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. GUSTAVO DIAZ ORDAZ ENTRE LOPEZ DE SANTA ANA Y CALLE MIRAMON, ASI COMO CALLE ISMAEL COMONFORT ENTRE G. DIAZ ORDAZ Y M. ANLA.	COL. NUEVA LAGUNA NORTE	\$ 99,360.91	\$ 99,360.91	\$ 96,360.69		ML	215	14 HOGARES	EN PROCESO	90.00%	30.00%
3	133500132	13350003	CO-003-13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA PARA REFORZAR LA RED EXISTENTE EN EL EJIDO	EJIDO LA PERLA	\$ 180,810.39	\$ 180,810.39	\$ 175,148.63		ML	200	180 HOGARES	EN PROCESO	2.00%	0.00%
4	133500133	13350004	CO-004-13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE C. 24 DE FEBRERO Y PARCELAS AL OTE. DEL EJIDO	EJIDO LA PARTIDA	\$ 485,355.36	\$ 485,355.36	\$ 473,253.78		ML	1720	30 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	99.81%
5	133500134	13350005	CO-005-13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EN PRIVADA LAGUNA DEL REY	COL. VALLE LA ROSITA	\$ 30,079.39	\$ 30,079.39	\$ 29,586.44		ML	50	6 HOGARES	EN PROCESO	70.00%	49.39%
6	133500135	13350006	CO-006-13	C. LAGUNA DE LA ROSITA, ENTRE C. GEMINIS Y PROL. DIAGONAL DE LAS FUENTES ASI COMO CALLE GEMINIS ENTRE C. AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAGUNA DE LA ROSITA Y C. ARRECO	COL. VALLE LA ROSITA	\$ 73,740.00	\$ 73,740.00	\$ 70,944.84		ML	125	12 HOGARES	EN PROCESO	90.00%	79.68%
7	133500136	13350007	CO-007-13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN POR EL SECTOR DE LOS REJIBICADOS	AMPLIACION EL RANCHITO	\$ 147,651.71	\$ 147,651.71	\$ 139,801.17		ML	497	10 HOGARES	EN PROCESO	2.00%	30.00%
8	133500138	13350008	CO-008-13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. JACINTO CANEK	COL. CAMILO TORRES	\$ 166,879.93	\$ 166,879.93	\$ 151,012.36		ML	300	25 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	100.00%
9	133500139	13350009	CO-009-13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VIVIENDAS COLINDANTES CON FRACCIONAMIENTO	EJIDO LA PERLA	\$ 28,570.83	\$ 28,570.83	\$ 27,208.84		ML	125	6 HOGARES	EN PROCESO	90.00%	0.00%
10	133500140	13350010	CO-010-13	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LINEA PARA REFORZAR LA RED EXISTENTE EN EL EJIDO EN EL SECTOR CONOCIDO COMO LAS CRIBAS	EJIDO LA CONCHA	\$ 502,410.19	\$ 502,410.19	\$ 479,901.62		ML	860	55 HOGARES	EN PROCESO	8.00%	0.00%
11	133500141	13350011	CO-011-13	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PROFRA. JOSEFINA RODARTE	EJIDO LA ROSITA	\$ 90,442.06	\$ 90,442.06	\$ 87,628.04		ML	105.00	8 HOGARES	EN PROCESO	2.00%	30.00%
12	133500154	13350012	CO-012-13	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EN PRIVADA LAGUNA DEL REY	COL. VALLE LA ROSITA	\$ 55,169.64	\$ 55,169.64	\$ 53,942.81		ML	75.00	6 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	99.58%
13	133500155	13350013	CO-013-13	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN C. LAGUNA DE LA ROSITA ENTRE C. GEMINIS Y PROL. DIAGONAL DE LAS FUENTES ASI COMO CALLE GEMINIS ENTRE C. LAGUNA DE LA ROSITA Y C. ARRECO	COL. VALLE LA ROSITA	\$ 124,901.20	\$ 124,901.20	\$ 119,994.50		ML	130.00	12 HOGARES	FINQUITADA	100.00%	99.87%
14	133500156	13350014	CO-014-14	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. JACINTO CANEK	COL. CAMILO TORRES	\$ 267,600.43	\$ 267,600.43	\$ 261,025.36		ML	366.00	25 HOGARES	TERMINADA	98.00%	68.98%
15	133500157	13350015	CO-015-13	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE C. 24 DE FEBRERO Y PARCELAS AL OTE. DEL EJIDO	EJIDO LA PARTIDA	\$ 906,973.81	\$ 906,973.81	\$ 902,725.04		ML	1500.00	30 HOGARES	EN PROCESO	90.00%	0.00%
16	133500158	13350016	CO-016-13	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HNOS. RIOS, CALLE FORTINO MARTINEZ Y CALLE HNOS. MUÑOZ, ENTRE CALLE AURELIO ESQUIVEL Y CALLE SEBASTIAN AGUIRRE	EJIDO RANCHO ALGIRE	\$ 95,140.70	\$ 95,140.70	\$ 91,989.09		ML	130.00	7 HOGARES	EN PROCESO	50.00%	30.00%

Ing. Javier Gustavo Gomez Acosta
Secretario Técnico del Copiadem



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON

CORTE DEL 01/04/2013 AL 30/06/2013 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL



No.	No. de Asignación	No. de Obra	No. de Obra Municipal	DESCRIPCION DE LA OBRA	COLONIA O LOCALIDAD	INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS)				METAS		BENEFICIARIOS	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	
						COSTO TOTAL	FISCAL (FISM)	MODIFICADO (CONTRATADO)		U. MEDIDA	CANTIDAD			FISICO	FINACIERO
17	133500061	13/05/0019	CO-017-13	CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBIC. EN C. CUARENTA Y DOS	EX-EJIDO NUEVA CALIFORNIA	\$ 647,014.58	\$ 647,014.58	\$ 620,343.87		MODULO	1.00	126 ALUMNOS	EN PROCESO	2.00%	0.00%
18	133500062	13/05/0020	CO-018-13	REMODELACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. FRANCISCO SARABIA UBIC. EN C. REDENCION NACIONAL	COL. LA CONSTANCIA	\$ 101,732.85	\$ 101,732.85	\$ 100,125.33		MODULO	1.00	464 ALUMNOS	EN PROCESO	2.00%	0.00%
19	133500063	13/05/0021	CO-019-13	REMODELACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. COAHUILA UBIC. EN C. EUGENIO A. BENAVIDES Y AV. ABAISOLO	COL. CAROLINAS	\$ 630,540.44	\$ 630,540.44	\$ 610,419.29		MODULO	1.00	160 ALUMNOS	EN PROCESO	40.00%	30.00%
20	133500064	13/05/0022	CO-020-13	REMODELACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. COAHUILA UBIC. EN C. EUGENIO A. BENAVIDES Y AV. ABAISOLO	SEGUNDA DE COBIAN	\$ 222,853.93	\$ 222,853.93	\$ 220,233.45		MODULO	1.00	386 ALUMNOS	EN PROCESO	2.00%	0.00%
21	133500065	13/05/0023	CO-021-13	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 8X12 UBIC. EN ESC. PRIM. FEDERALIZADA ALFREDO G. BASURTO UBIC. EN C. PERU	COL. AVANACION	\$ 779,180.34	\$ 779,180.34	\$ 760,008.37		AULA	1.00	386 ALUMNOS	EN PROCESO	40.00%	45.22%
22	133500066	13/05/0024	CO-022-13	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 8X12 EN ESC. PRIM. OFICIAL ANTONIO DE JUAREZ Y BRACHO UBIC. EN AV. ALVARO OBREGON	COL. NUEVA CALIFORNIA	\$ 772,772.37	\$ 772,772.37	\$ 749,784.42		AULA	1.00	932 ALUMNOS	EN PROCESO	50.00%	30.00%
23	133500067	13/05/0025	CO-023-13	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 8X12 EN ESC. SEC. TECNICA No. 77 UBIC. EN BAHIA DE GUADALUPE Y ROVIROSA WADE	COL. NUEVA CALIFORNIA	\$ 761,502.10	\$ 761,502.10	\$ 755,653.11		AULA	1.00	1050 ALUMNOS	EN PROCESO	50.00%	30.00%
24	133500068	13/05/0026	CO-024-13	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES DE 8X12 EN ESC. PRIM. MTR. RAUL SIDRO BURGOS UBIC. EN HALCONES 400	COL. VILLA JACARANDAS	\$ 767,396.92	\$ 767,396.92	\$ 759,116.77		AULA	1.00	474 ALUMNOS	EN PROCESO	40.00%	30.00%
25	133500069	13/05/0027	CO-025-13	CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO DE COMPUTO DE 8X12 EN ESC. PRIM. GRAL. ALVARO OBREGON UBIC. EN AV. ALEJANDRO CASAS MARTINEZ No. 101	COL. COMPRESORA	\$ 812,052.64	\$ 812,052.64	\$ 779,999.74		CENTRO DE COMPUTO	1.00	160 ALUMNOS	EN PROCESO	10.00%	30.00%
26	133500070	13/05/0028	CO-026-13	CONSTRUCCION DE AULA PARA CENTRO DE COMPUTO DE 8X12 EN ESC. SEC. DEL EDO. PROF. BRAULIO CONTRERAS AMARO UBIC. EN PROF. ALEJANDRO CASAS S/N	COL. COMPRESORA	\$ 806,475.04	\$ 806,475.04	\$ 779,987.42		CENTRO DE COMPUTO	1.00	278 ALUMNOS	EN PROCESO	10.00%	30.00%
27	133500071	13/05/0029	CO-027-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES LATERALES EN ESC. PRIM. EMANCIPACION PROLETARIA, DOM. CONOCIDO	EJIDO EL AGUILA	\$ 110,825.50	\$ 110,825.50	\$ 103,994.91		ML	34.30	286 ALUMNOS	EN PROCESO	4.00%	85.93%
28	133500072	13/05/0030	CO-028-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES MIXTAS Y CONTRABARDAS EN J.N. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, DOM. CONOC.	EJIDO LA PARTIDA	\$ 620,712.73	\$ 620,712.73	\$ 602,656.23		ML	219.30	186 ALUMNOS	EN PROCESO	35.00%	47.96%
29	133500073	13/05/0031	CO-029-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN MAL ESTADO EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA UBIC. C. T. Y AVE 4a.	COL. EDUARDO GUERRA	\$ 911,409.97	\$ 911,409.97	\$ 894,824.87		ML	293.90	457 ALUMNOS	EN PROCESO	45.00%	30.00%
30	133500074	13/05/0032	CO-030-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN ESC. GRAL. No. 2 FEDERICO BERRIETO RAMON UBIC. EN CALZ. GENERAL LAZARO CAREÑAS No. 450 OTE	COL. EDUARDO GUERRA	\$ 632,394.11	\$ 632,394.11	\$ 624,953.43		ML	179.30	1500 ALUMNOS	EN PROCESO	5.00%	30.00%
31	133500075	13/05/0033	CO-031-13	CONSTRUCCION DE BARDAS Y BANQUETAS EXTERIORES Y DEMOLICION DE LAS EXISTENTES EN ESC. PRIM. MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBIC. EN CUITLALC Y CUAUTITLAN	COL. MOCTEZUMA	\$ 531,659.52	\$ 531,659.52	\$ 508,736.12		METRO LINEAL MET. CUADRADO	66.00 Y 621.20	543 ALUMNOS	EN PROCESO	2.00%	30.00%

Ing. Javier Gustavo Gómez Medina
Secretario Técnico del Copladem



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON

CORTE DEL 01/04/2013 AL 30/06/2013 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL



No.	No. de Asignación	No. de Obra	No. de Obra Municipal	DESCRIPCION DE LA OBRA	COLONIA O LOCALIDAD	INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS)			METAS		BENEFICIARIOS	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	
						COSTO TOTAL	FISCAL (FISM)	MODIFICADO (CONTRATADO)	U. MEDIDA	CANTIDAD			FISICO	FINANCIERO
32	133500076	133500034	CO-032-13	CONSTRUCCION DE BARDA FRONTAL EN J.N. SALVADOR NOVO UBIC. EN CALLE TALEGAS	COL. VILLA LA MERCEZ (SIGLO XXI)	\$ 293,780.58	\$ 293,780.58	\$ 298,964.21	ML.	83.40	150 ALUMNOS	EN PROCESO	10.00%	30.00%
33	133500077	133500035	CO-033-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDA PRINCIPAL Y POSTERIOR EN MAL ESTADO EN ESC. SEC. TECNICA No. 42 UBIC. EN C. GERVASO VIZQUEZ	COL. CARMEN ROMANO	\$ 609,014.47	\$ 609,014.47	\$ 579,900.01	ML.	213.15	435 ALUMNOS	EN PROCESO	10.00%	30.00%
34	133500078	133500036	CO-034-13	CONSTRUCCION DE BARDA POSTERIOR EN ESC. PRIM. DR. GABINO BARREDA UBIC. EN CABO FALSO SIN	COL. NUEVA CALIFORNIA	\$ 281,844.48	\$ 281,844.48	\$ 275,038.12	ML.	118.30	570 ALUMNOS	EN PROCESO	35.00%	30.00%
35	133500079	133500037	CO-035-13	CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN J.N. MARCOS MOSHINSKY BORODANSKY UBIC. EN CERRO VIEJO SIN Y BLVD. OBSIDIANA	LOMA REAL / EX. EIDO LA JOYA SECTOR LAS NUEVAS	\$ 502,820.56	\$ 502,820.56	\$ 489,692.43	ML.	161.00	158 ALUMNOS	EN PROCESO	10.00%	30.00%
36	133500080	133500038	CO-036-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y LATERAL QUE COLINDA CON PERIF. EN ESC. SEC. TECNICA No. 36 UBIC. EN ERRAZO DEL NORTE	COL. EL ROBLE	\$ 1,042,828.16	\$ 1,042,828.16	\$ 994,164.90	ML.	397.00	346 ALUMNOS	EN PROCESO	2.00%	0.00%
37	133500081	133500039	CO-037-13	CONSTRUCCION DEL MODULO DE SANTARIOS EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOZZI UBIC. EN FLAMINGO Y GAVIOTAS	COL. FOVISSTE LA ROSITA	\$ 620,845.39	\$ 620,845.39	\$ 604,755.01	MODULO	1.00	340 ALUMNOS	EN PROCESO	28.00%	30.00%
38	133500082	133500040	CO-038-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES INTERIORES EN MAL ESTADO EN ESC. PRIM. MEXICO Y J.N. ANEXO TM UBIC. EN C. DECOLLADO ESC. CON AVE. BRANCO	COL. LUIS ECHEVERRIA	\$ 232,041.79	\$ 232,041.79	\$ 228,990.35	ML.	78.60	245 ALUMNOS	EN PROCESO	2.00%	0.00%
39	133500083	133500041	CO-039-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS PERIMETRALES EXTERIORES EN J.N. AMELIA DEL CASTILLO LEDON UBIC. 49. DEL TIRO No. 317	COL. VICENTE GUERRERO	\$ 58,149.33	\$ 58,149.33	\$ 55,995.59	M2	107.52	176 ALUMNOS	EN PROCESO	2.00%	0.00%
40	133500084	133500042	CO-040-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS INTERIORES EN J.N. CUAUHTEMOC UBIC. EN MONTE KENIA	COL. VALLE DORADO	\$ 455,494.52	\$ 455,494.52	\$ 440,388.55	M2	844.69	156 ALUMNOS	EN PROCESO	2.00%	0.00%
41	133500085	133500043	CO-041-13	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. LUC. JUAN ANTONIO DE LA FUENTE UBIC. EN CARR. TORREON-LA PARTIDA, "CIUDAD DE LOS NIÑOS"	ELIDO LA PARTIDA	\$ 347,226.03	\$ 347,226.03	\$ 346,581.43	M2	608.00	130 ALUMNOS	EN PROCESO	80.00%	79.47%
42	133500086	133500044	CO-042-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. TECNICA No. 71 UBIC. EN C. NAPO SIN	COL. VALLE ORIENTE	\$ 1,037,817.61	\$ 1,037,817.61	\$ 1,017,745.98	TECHUMBRE	1.00	1350 ALUMNOS	EN PROCESO	25.00%	30.00%
43	133500087	133500045	CO-043-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE EXISTENTE EN ESC. SEC. TECNICA No. 75 UBIC. EN C. CLAVEL Y MARGARITAS	COL. LA DALIA	\$ 310,361.25	\$ 310,361.25	\$ 304,465.52	M2	463.84	1200 ALUMNOS	EN PROCESO	80.00%	80.16%
44	133500088	133500046	CO-044-13	CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE EXISTENTE EN ESC. SEC. GENERAL No. 15 UBIC. EN AV. UNIVERSIDAD SIN	COL. JOYAS DEL ORIENTE	\$ 411,790.66	\$ 411,790.66	\$ 402,920.20	M2	618.24	680 ALUMNOS	EN PROCESO	80.00%	91.57%
45	133500089	133500047	CO-045-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TECHUMBRE EXISTENTE EN ESC. PRIM. GENERAL LUCIO BLANCO UBIC. EN CESAREO CASTRO	COL. JARDINES DE CALIFORNIA	\$ 402,298.64	\$ 402,298.64	\$ 390,022.74	M2	635.16	828 ALUMNOS	EN PROCESO	45.00%	30.00%

Ing. Javier Gustavo Gomez Acuña
Secretaría Técnica del Copiadem



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOREON

CORTE DEL 01/04/2013 AL 30/06/2013 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL



No.	No. de Asignación	No. de Obra	No. de Obra Municipal	DESCRIPCION DE LA OBRA	COLONIA O LOCALIDAD	INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS)			METAS		BENEFICIARIOS	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	
						COSTO TOTAL	FISCAL (FSM)	MODIFICADO (CONTRATADO)	U. MEDIDA	CANTIDAD			FISICO	FINANCIERO
46	133500060	13350048	CO-046-13	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. PROF. VICTOR GARCIA CARRERO T.M. UBIC. EN C. PELTRES	COL. RINCON LA MERCED	\$ 357,009.00	\$ 357,009.00	\$ 344,992.07	M2	618.24	956 ALUMNOS	EN PROCESO	10.00%	0.00%
47	133500061	13350049	CO-047-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. MARIA DEL CARMEN ASPE PICO UBIC. EN AV. PRIMAYVERA 1100	COL. NUEVA MERCED	\$ 1,031,304.83	\$ 1,031,304.83	\$ 1,049,537.78	TECHUMBRE	1.00	560 ALUMNOS	EN PROCESO	44.00%	0.00%
48	133500062	13350050	CO-048-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA UBIC. EN C. NOCHISTLAN SIN	COL. VALLE ORIENTE	\$ 1,044,900.19	\$ 1,044,900.19	\$ 1,000,417.08	TECHUMBRE	1.00	320 ALUMNOS	CONTRATADA	2.00%	0.00%
49	133500063	13350051	CO-049-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. GENERAL No. 11 UBIC. EN CANAL DE LA PERLA Y AV. DE LOS SARAPE	COL. RINCON LA MERCED	\$ 1,048,495.96	\$ 1,048,495.96	\$ 999,725.25	TECHUMBRE	1.00	1179 ALUMNOS	CONTRATADA	10.00%	0.00%
50	133500064	13350052	CO-050-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. DON MARIANO MATAMOROS UBIC. EN PISO JACARANDAS OTE	COL. JACARANDAS	\$ 1,300,917.59	\$ 1,300,917.59	\$ 1,249,962.44	TECHUMBRE	1.00	339 ALUMNOS	EN PROCESO	2.00%	0.00%
51	133500065	13350053	CO-051-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. NUEVA CREACION UBIC. EN PASO DE LOS TABACHINES	COL. JARDONES UNIVERSIDAD	\$ 771,624.72	\$ 771,624.72	\$ 740,896.40	TECHUMBRE	1.00	130 ALUMNOS	EN PROCESO	10.00%	30.00%
52	133500066	13350054	CO-052-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION UBIC. EN PASO DE LOS TABACHINES	COL. JARDONES UNIVERSIDAD	\$ 1,297,365.02	\$ 1,297,365.02	\$ 1,249,613.06	TECHUMBRE	1.00	240 ALUMNOS	EN PROCESO	10.00%	0.00%
53	133500067	13350055	CO-053-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. CINENTE VALDEZ VALDEZ UBIC. EN CERRO DE LA IGLESIA	COL. RESOCCAL DEL NAZAS	\$ 767,259.31	\$ 767,259.31	\$ 736,825.34	TECHUMBRE	1.00	420 ALUMNOS	EN PROCESO	50.00%	30.00%
54	133500068	13350056	CO-054-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. OFICIAL RAMON LOPEZ VELAZQUEZ UBIC. EN C. HACIENDA DE XALPA	EX HACIENDA LA PERLA	\$ 770,843.46	\$ 770,843.46	\$ 750,043.19	TECHUMBRE	1.00	415 ALUMNOS	EN PROCESO	15.00%	30.00%
55	133500069	13350057	CO-055-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. SEC. GENERAL No. 14 T.M. UBIC. EN HACIENDA DE LA LAGUNA ES HACIENDA DE LOS REMEDIOS	EX HACIENDA LA PERLA	\$ 858,653.18	\$ 858,653.18	\$ 840,414.90	TECHUMBRE	1.00	239 ALUMNOS	EN PROCESO	30.00%	77.61%
56	133500100	13350058	CO-056-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. ESPAÑA UBIC. EN C. JUAN PABLOS Y AVE. ALLENDE	COL. CUARTA DE COBAN	\$ 505,083.28	\$ 505,083.28	\$ 488,899.76	TECHUMBRE	1.00	240 ALUMNOS	EN PROCESO	8.00%	0.00%
57	133500101	13350059	CO-057-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE VITROPISO EN AULAS DIDACTICAS E IMPERMEABILIZACION EN J.N. FRANCISCO SARABIA UBIC. EN C. ECUADOR No. 364	COL. AVACION	\$ 354,967.65	\$ 354,967.65	\$ 338,577.89	REHABILITACION	1.00	100 ALUMNOS	EN PROCESO	2.00%	30.00%
58	133500102	13350060	CO-058-13	REHABILITACION DE TECHUMBRE EXISTENTE Y CONSTRUCCION DE RAMPA PARA ACCESO DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN J.N. LUZ MARIA SERRADELL ROMERO UBIC. EN C. "C" No. 567	COL. EDUARDO GUERRA	\$ 82,187.73	\$ 82,187.73	\$ 79,000.03	REHABILITACION	1.00	245 ALUMNOS	EN PROCESO	5.00%	30.00%
59	133500103	13350061	CO-059-13	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. OFICIAL MIGUEL HIDALGO UBIC. EN C. No. 25 ESO. CON AV. ALLENDE	COL. CUARTA DE COBAN	\$ 956,908.69	\$ 956,908.69	\$ 340,128.18	N.L.	116.00	253 ALUMNOS	EN PROCESO	2.00%	30.00%

Ing. Javier Gustavo Gomez Acuña
Secretario Técnico del Copadom



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TORREON

CORTE DEL 01/04/2013 AL 30/06/2013 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL



No.	No. de Asignación	No. de Obra	No. de Obra Municipal	DESCRIPCION DE LA OBRA	COLONIA O LOCALIDAD	INVERSION ASIGNADA 2013 (PESOS)				METAS		BENEFICIARIOS	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	
						COSTO TOTAL	FISCAL (FISM)	MODIFICADO (CONTRATADO)		U. MEDIDA	CANTIDAD			FISICO	FINANCIERO
60	133500104	13350062	CO-060-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. CENTENARIO ROTARIO EN LAGO ERE Y LAGO SUPERIOR	COL. ZARAGOZA SUR	\$ 774,033.01	\$ 774,033.01	\$ 745,366.05		TECHUMBRE	1.00	169 ALUMNOS	EN PROCESO	20.00%	0.00%
61	133500105	13350063	CO-061-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN J.N. INDEPENDENCIA UBIC. EN C. ENSENADA	COL. LAS JULIETAS	\$ 500,088.10	\$ 500,088.10	\$ 484,960.35		TECHUMBRE	1.00	160 ALUMNOS	EN PROCESO	30.00%	0.00%
62	133500106	13350064	CO-062-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. LUIS DONALDO COLOSO UBIC. EN C. DEL REMATE Y AV. UNIVERSIDAD	COL. PRADOS DEL ORIENTE	\$ 1,042,373.66	\$ 1,042,373.66	\$ 1,010,066.22		TECHUMBRE	1.00	469 ALUMNOS	EN PROCESO	65.00%	0.00%
63	133500107	13350066	CO-063-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. NUEVA CREACION UBIC. EN C. OKAYAMA SIN	COL. JOYAS DE TORREON	\$ 769,510.55	\$ 769,510.55	\$ 747,186.31		TECHUMBRE	1.00	180 ALUMNOS	EN PROCESO	5.00%	30.00%
64	133500108	13350066	CO-064-13	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN ESC. CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA UBIC. EN C. NOGALAR NEGRO	COL. RINCON LOS NOGALES	\$ 1,031,581.45	\$ 1,031,581.45	\$ 1,005,501.33		TECHUMBRE	1.00	240 ALUMNOS	EN PROCESO	65.00%	0.00%
65	133500109	13350067	CO-065-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES EN J.N. EJERCITO MEXICANO UBIC. EN CALZ. LA JOYITA	EJIDO LA JOYA	\$ 845,487.95	\$ 845,487.95	\$ 818,426.91		ML	215.00	130 ALUMNOS	EN PROCESO	10.00%	0.00%
66	133500110	13350068	CO-066-13	REMODELACION Y REHABILITACION DE BARRA EN ACCESO PRINCIPAL ASI COMO SOBRE ELEVACION DE BARRA EN ESC. PRIM. AÑO DE MADERO T.M. Y FRANCISCO VALLA T.V. UBIC. EN PROL. BLVD. INDEPENDENCIA M.M. 2224 DTE	COL. NUEVA ROSITA	\$ 320,458.93	\$ 320,458.93	\$ 315,028.69		ML	80.8	271 ALUMNOS	EN PROCESO	5.00%	30.00%
67	133500111	13350068	CO-067-13	CONSTRUCCION DE BARDAS Y CONTRABARDAS PERIMETRALES EN ESC. PRIM. LIBERACION PROLETARIA T.V.	EJIDO SAN AGUSTIN	\$ 340,773.19	\$ 340,773.19	\$ 325,239.36		ML	103	440 ALUMNOS	EN PROCESO	70.00%	0.00%
68	133500112	13350070	CO-068-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y SOBRE ELEVACION DE MUROS EXISTENTES EN ESC. PRIM. GRAL. EULALIO GUTIERREZ ORTIZ UBIC. EN C. ALEJANDRO CASAS	COL. COMPRESORA	\$ 467,527.32	\$ 467,527.32	\$ 453,945.86		ML	232.4	182 ALUMNOS	CONTRATADA	2.00%	0.00%
69	133500113	13350071	CO-068-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLOMICA PERIMETRAL EN J.N. PROFRA. ESTEFANIA CASTAÑEDA UBIC. EN AND. PINABETES	COL. HOGARES FERROCARRILEROS	\$ 557,182.57	\$ 557,182.57	\$ 548,134.07		ML	183.3	118 ALUMNOS	CONTRATADA	2.00%	0.00%
70	133500114	13350072	CO-070-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y DEMOLICION DE BARDAS EN MAL ESTADO EN ESC. PRIM. AMELIA CASAS ALVAREZ UBIC. EN AV. PDTE. CARRANZA	COL. LA AMISTAD	\$ 814,041.79	\$ 814,041.79	\$ 785,045.73		ML	244	461 ALUMNOS	EN PROCESO	22.00%	30.00%
71	133500115	13350073	CO-071-13	CONSTRUCCION DE BARDAS Y BANQUETAS PERIMETRALES EN J.N. ROSAURA ZAPATA	EJIDO ANA	\$ 724,018.84	\$ 724,018.84	\$ 700,314.61		ML	247.65	135 ALUMNOS	EN PROCESO	2.00%	30.00%
72	133500116	13350074	CO-072-13	CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRALES Y BANQUETAS Y DEMOLICION DE LAS QUE ESTEN EN MAL ESTADO EN J.N. SINFONIA UBIC. EN C. PELICANOS Y VILLA JACARANDAS	COL. VILLA JACARANDAS	\$ 855,670.79	\$ 855,670.79	\$ 847,318.45		ML	290	171 ALUMNOS	EN PROCESO	20.00%	30.00%
73	133500117	13350075	CO-073-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLOMICA EN BARDAS PERIMETRALES EN ESC. PRIM. FELICITAS SIPLUNTES OCHOA UBIC. EN BLVD. ALONSO GOMEZ Y PLAZA RICA	COL. VILLA FLORIDA	\$ 146,235.26	\$ 146,235.26	\$ 138,660.39		ML	341	409 ALUMNOS	EN PROCESO	2.00%	30.00%
74	133500119		CO-074-13	ELEVAR LAS BARDAS, SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA CICLOMICA EN LAS BARDAS PERIMETRALES Y REHABILITACION DE BANQUETAS PERIMETRALES EN MAL ESTADO EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO, COSTILLA	COL. GONZALEZ ORTEGA	\$ 514,109.32	\$ 514,109.32	\$ 506,998.94		ML	173.15	363 ALUMNOS	EN PROCESO	60.00%	30.00%
75	133500120	13350076	CO-075-13	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, MALLA SOMBRAY PINTURA EN TECHUMBRE EXISTENTE EN J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINQUEZ UBIC. EN C. PESCADOR	SAN ANTONIO DE LOS EJIDOS BRAVOS	\$ 190,573.24	\$ 190,573.24	\$ 181,824.87		REHABILITACION	1.00	231 ALUMNOS	EN PROCESO	2.00%	0.00%

Ing. Javier Gustavo Gomez Acuña
Secretario Técnico del Copladem



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL

MUNICIPIO: PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TOREON

CORTE DEL 01/04/2013 AL 30/06/2013 SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL



No. de Asignación	No. de Obra	No. de Obra Municipal	DESCRIPCION DE LA OBRA	COLONIA O LOCALIDAD	INVERSION ASIGNADA 2013 (PRESOS)			METAS		BENEFICIARIOS	ESTADO	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO	
					COSTO TOTAL	FISCAL (FISM)	MODIFICADO (CONTRATADO)	U. MEDIDA	CANTIDAD			FISICO	FINANCERO
76	133500121	13350077	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, MALLA SOMBRERA Y PINTURA EN TECHUMBRE EXISTENTE EN J.N. EDUARDO CLAPARADE EN AV. SAN CARLOS Y BAHIA DE BALLENAS	COL. NUEVA CALIFORNIA	\$ 174,146.13	\$ 174,146.13	\$ 170,625.63	REHABILITACION	1.00	271 ALUMNOS	EN PROCESO	5.00%	30.00%
77	133500122	13350078	CONSTRUCCION DE ALULA DE USOS MULTIPLES EN J.N. FUNDADORES DE TORREON, UBIC. EN AV. DE LOS ARBOLES	COL. EL ROBLE 1	\$ 745,575.07	\$ 745,575.07	\$ 727,960.05	ALULA	1.00	63 ALUMNOS	EN PROCESO	10.00%	30.00%
78	133500123	13350079	DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE BARDAS EN J.N. HEROES DE CHAPULTEPEC UBIC. EN AND Y CERRADA 1a. DE MAYO No.18	COL. ALAMEDAS	\$ 397,983.20	\$ 397,983.20	\$ -	ML	117.00	135 ALUMNOS	EN PROCESO	2.00%	0.00%
79	133500124	13350080	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO UBIC. EN C. LLAS Y EGLANTINAS	COL. LA DALIA	\$ 338,972.43	\$ 338,972.43	\$ 328,978.47	M2	638.24	200 ALUMNOS	EN PROCESO	70.00%	30.00%
80	133500126	13350081	REMODELACION Y REHABILITACION DE PACHADA, SUMINISTROS E INSTALACION DE PROTECCIONES DE HERRERIA EN LAS AULAS EN ESC. SEC. TEC. No. 91 UBIC. EN C. ONCE	COL. BRAULLO FERNANDEZ AGUIRRE	\$ 99,044.24	\$ 99,044.24	\$ 96,432.49	REHABILITACION	1.00	425 ALUMNOS	EN PROCESO	2.00%	0.00%
81	133500128	13350017	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE Y COMPLEMENTO DE PATIO CIVICO EN J.N. YOLOTZIN, UBIC. EN P. DE LAS ETNIAS Y CALZ. CONTINENTES	COL. LAS ETNIAS	\$ 614,695.05	\$ 614,695.05	\$ 604,917.88	M2	215.15	60 ALUMNOS	CONTRATADA	5.00%	30.25%
82	133500129	13350018	REMODELACION Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC UBIC. EN NAZARIO ORTIZ GARZA Y AV. INDEP	COL. LIBERTAD	\$ 292,020.52	\$ 292,020.52	\$ 291,450.16	M2	215.15	433 ALUMNOS	CONTRATADA	5.00%	0.00%
83	133500119		CONSTRUCCION DE ANDADORES INCLUYENDO DEMOLICIONES EN ESC. PRIM. TORREON EN AV. ZACATECAS No. 450	COL. TORREON	\$ 1,310,651.44	\$ 1,310,651.44	\$ 1,296,997.52	M2	2163.00	483 ALUMNOS	EN PROCESO	2.00%	0.00%
84	133500120		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. DESPERTAR LAGUNERO, DOM. CONOCIDO	EJIDO SAN ANTONIO DE LOS BRAVOS	\$ 939,156.39	\$ 939,156.39	\$ -	ML	324.00	341 ALUMNOS	EN PROCESO	2.00%	0.00%
TOTAL					\$ 44,406,705.12	\$ 44,406,705.12	\$ 41,882,445.36						

Ing. Javier Gustavo Gomez Medina

Secretario Tecnico del Copladem
